


## Dashboard: Project Analyse – per project

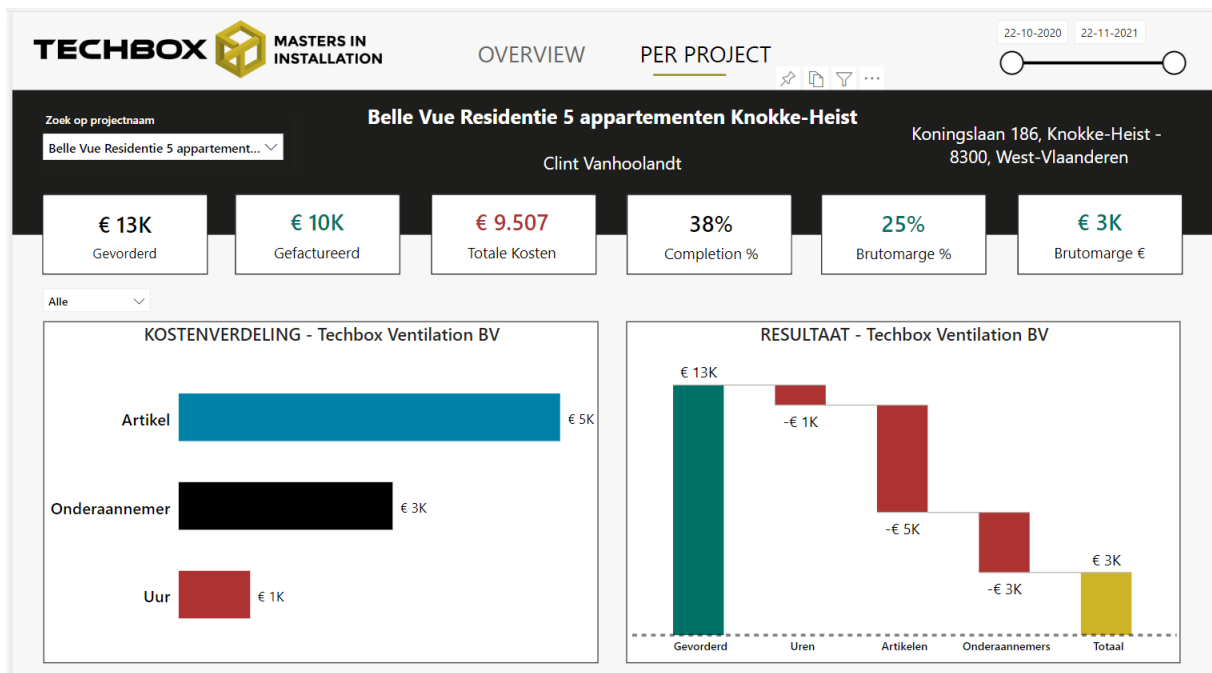

### Wat missen wij op dit dashboard?


1. Verhouding van de materiaalkost (artikel) tov gevorderde [%]
2. Verhouding van de loonkost (uren) tov gevorderde [%]
3. Verhouding van de huidige materiaalkost (artikel) tov de initieel gecalculeerde
4. Verhouding van de huidige loonkost (uren) tov de intieel gecalculeerde

### Voorstel om dit voor ons in één opslag visueel duidelijk te maken.

Voor 1. en 2. zou een speedometer hier een visual kunnen zijn, waarbij we als oranje zone een zone tussen 30% en 40% zetten – nog definitief te bepalen. Rood is boven target – geel is binnen target – groen is onder target (beter gepresteerd)




Voor 3. en 4. zou dit de staafdiagrammen kunnen zijn in de blok 'Resultaat – Techbox Ventilation BV – die opgevuld worden. We starten steeds met maximale blok (= het contractueel voorziene budget) in een lichte tint en vullen met een donkere tint de staaf verder op.

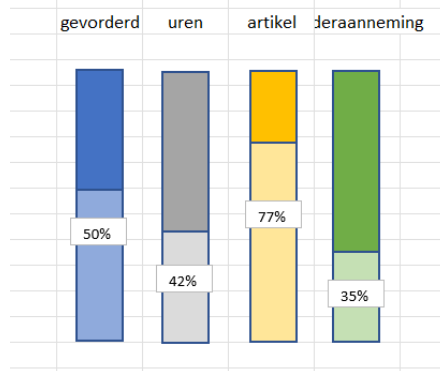

### Hoe kan het nieuwe dashboard eruit zien?

- Alle visuels dienen mee te gaan met de geselecteerde periode

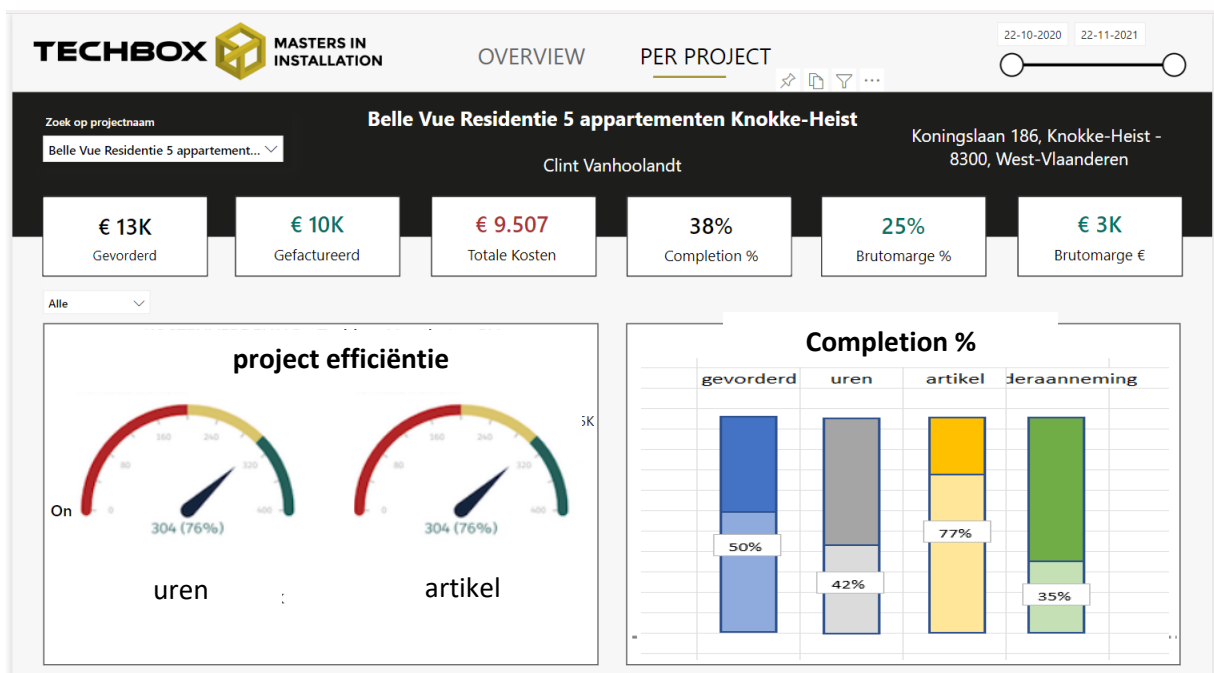

Data voor Completion kan gehaald worden uit Bouwsoft:

Projecten Knokke-H    Status ● Goedgekeurd    13-4-2021

roep    P-Nr P-202101152    U-Nr U-202100858    Acties    Toevoegen    >

Dashboard    **Tiijljin**    Dossier    Contracten    Fases    Eigen velden    Extra ▾

Inclusief Subprojecten	<input type="checkbox"/>	
Goedgekeurde Offertes		
Artikelen	10 228,15	
Uren	10 052,34	335,04
Materieel	11 333,70	
Onderaannemers	0,00	
Netto	<b>21 414,19</b>	
Vaste Kost	0,00	
Bouwkost	0,00	
Commissie	0,00	
Brutokost	<b>21 414,19</b>	
Directe Korting	0,00	
Totale Korting	0,00	
Marge	11 552,51	% Besteld / Voorzien 31,69 %
Goedgekeurde Offertes	32 966,70	
Bestelbonnen	3 241,41	% Uitgevoerd / Voorzien 38,47 %
Vorderingsstaten	12 680,67	
